

Centro Comunitario de la Biblioteca de Mount Vernon

Actualización mensual: Febrero de 2023




ACTIVIDADES ACTUALES

A partir del 26 de enero, se ha instalado en el sitio la grúa torre de 120 pies de alto. La grúa se utilizará durante los próximos meses para mover encofrados de hormigón, acero estructural y otros elementos pesados del proyecto. Los esfuerzos de mejora del terreno (instalación de pilares de áridos apisonados) finalizarán a principios de marzo, con más de 950 pilares instalados hasta la fecha.

Continúan los trabajos de instalación y reubicación de servicios públicos en múltiples zonas de la obra, la mayoría de los cuales estarán terminados a fin de mes. La plataforma del edificio se ha cortado hasta el subsuelo y se ha iniciado la excavación para los cimientos de estera profunda: una losa de hormigón continua de 6 pies de espesor que se extiende por la mayor parte de la superficie del edificio y soportará la pesada carga del estacionamiento.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

Las grúas torre les permiten a los equipos del proyecto de construcción completar las operaciones más difíciles. Se ocupan de actividades como levantar y colocar vigas de acero en su sitio, transportar materiales de construcción, mover equipos pesados y mucho más. El contrapeso se utiliza para equilibrar el peso del objeto que se eleva.

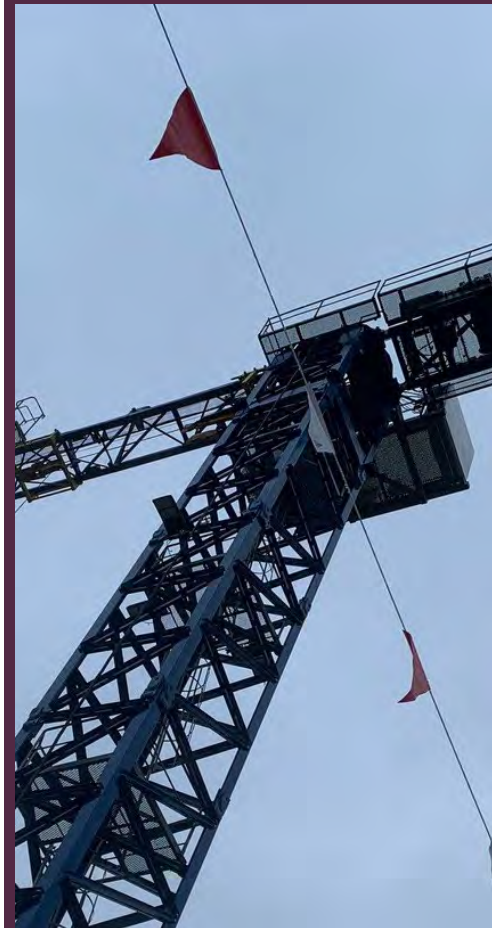

IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL TRÁFICO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

- 3rd St. estará cerrada entre W. Kincaid y W. Broadway mientras dure el proyecto.
- Actualmente, 2nd St. hacia el norte en Kincaid y Kincaid hacia el este entre 2nd St. y 3rd St. experimentan cierres parciales de carriles.
- El cruce peatonal en 3rd & Kincaid se verá afectado hasta febrero. El cruce de norte a sur en Kincaid estará restringido a un solo cruce peatonal.
- Si tiene preguntas o inquietudes en relación con el impacto del proyecto, comuníquese con la Ciudad a Libcomconst@mountvernonwa.gov o llame al 360-419-3252



CRONOGRAMA

Las actividades programadas para los próximos meses se centrarán en las mejoras del terreno, las obras de servicios públicos y los cimientos del edificio. Se ha instalado la grúa torre, ¡así que pronto verá al edificio comenzar a erguirse!

